

令和5年9月14日

地域にお住いの皆様へ

一般財団法人クリーンいわて事業団

## 公共関与型産業廃棄物最終処分場整備事業に係る 処理水放流管敷設工事の進捗状況のお知らせ

八幡平市平館における標記施設の整備につきましては、平素より特段の御理解、御協力をいただき、厚く御礼申し上げます。現在、椛沢地区内などで行っている処理水放流管敷設工事の進捗等について、以下のとおり御報告します。

### 1 8月～10月の工事工程（工事期間：令和4年12月13日～令和6年7月15日）

施工内容	令和5年			備考
	8月	9月	10月	
全体延長 2,484.5m (内、市道区間2,018.5m)				8月24日時点
放流管布設工				1,350m 施工済み (進捗率 54.3%)
マンホール工	— —		—	全7箇所の内、 4箇所施工済み
仮復旧工（舗装）	—	—		1,280m 施工済み (進捗率 63.4%)

- ・令和5年8月から10月については、引続き片側通行で施工します。
- ・市道の処理水放流管敷設工事は、令和5年10月に完了予定です。
- ・市道の舗装本復旧は、令和5年11月（上流の一部区間は令和6年4月頃）に完了予定です。
- ・施工時は、交通誘導員2名を規制区間の前後に配置し、事故防止に努めますが、お近くを通行する際、または工事がお住まい付近に差し掛かった際には、御不便をお掛けする場合もございますので、何卒御理解を賜りますようお願い申し上げます。

#### お問い合わせ先


##### 【発注者】

一般財団法人 クリーンいわて事業団八幡平駐在（TEL：0195-78-8872）

##### 【受注者】

岩井建設株式会社（所在地：雫石町 TEL：019-692-1181）

## 2 施工状況平面図

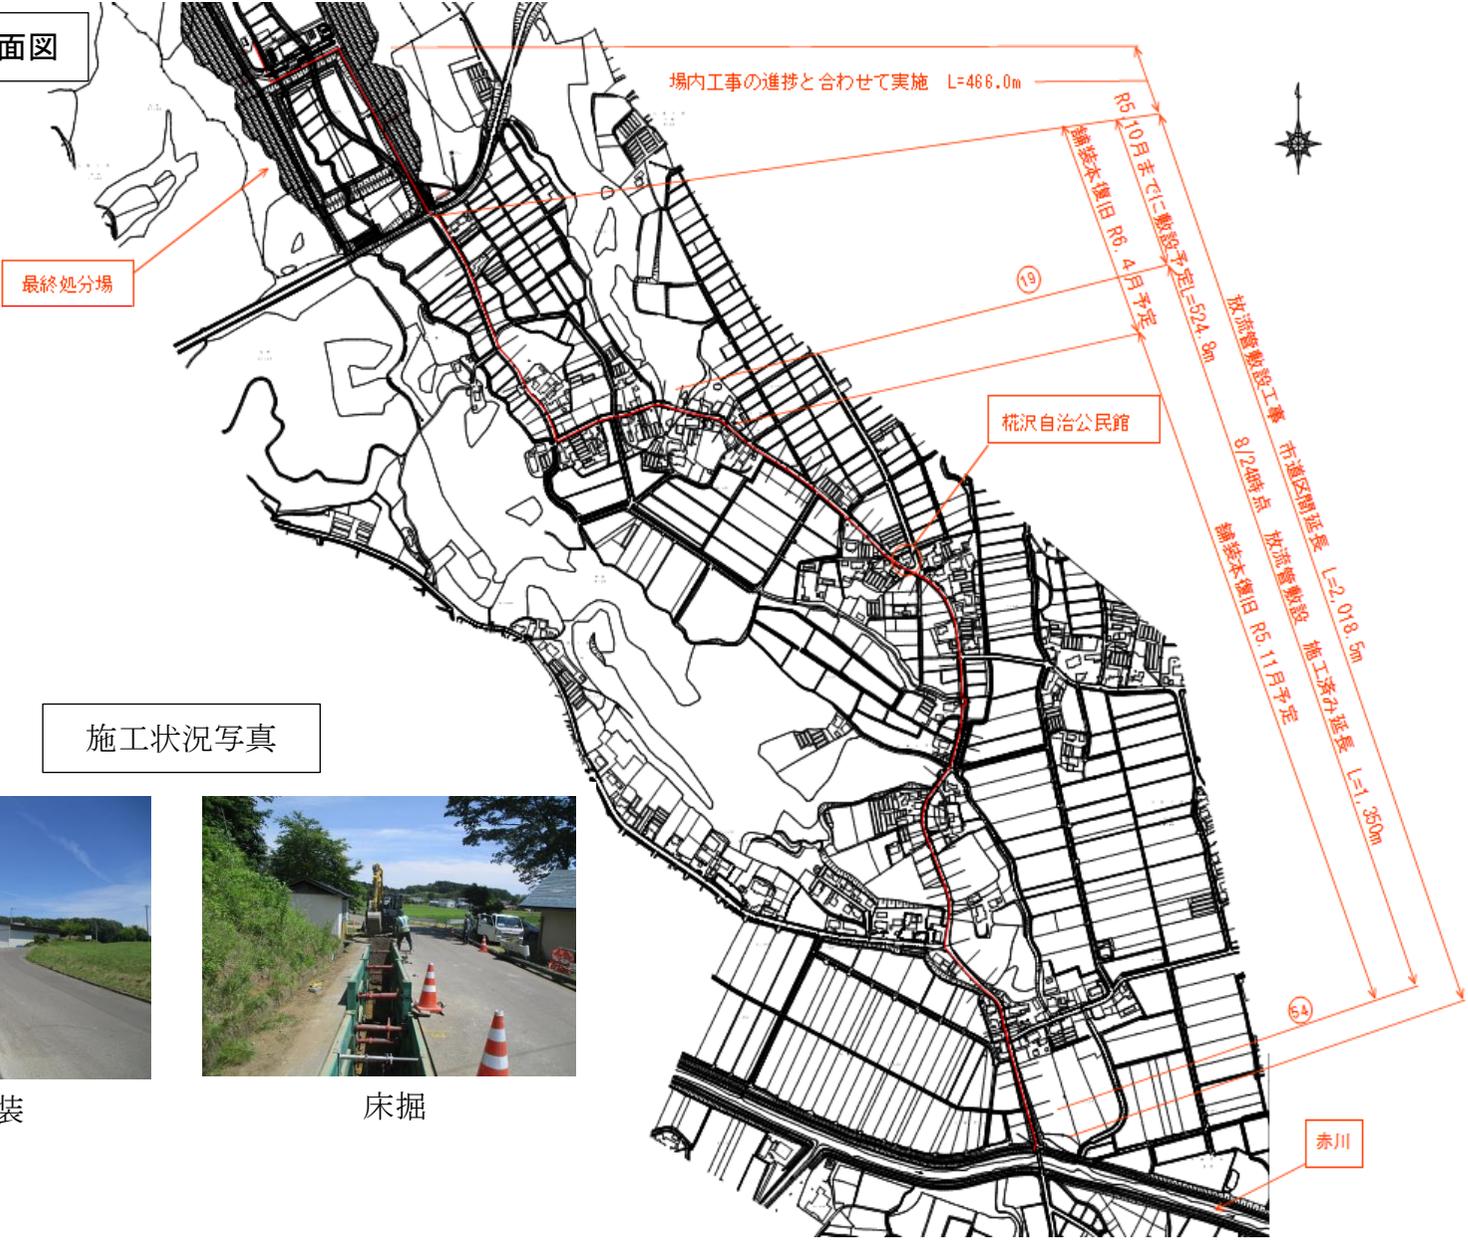

## 施工状況写真



仮舗装



床掘
