

地域にお住まいの皆様へ

一般財団法人クリーンいわて事業団

公共関与型産業廃棄物最終処分場整備事業に係る 土木施設建設工事の進捗状況のお知らせ

八幡平市平舘における標記施設の整備につきましては、平素より特段の御理解、御協力をいただき、厚く御礼申し上げます。建設工事の進捗等について、以下のとおり御報告します。

1 処分場整備事業場内の工事工程

施 工 内 容	令和6年		
	3月	4月	5月
仮設工 除雪工	3月末で完了予定		
敷地造成工 掘削工、盛土工		準備工 ■■■	当面継続
雨水排水設備工 側溝工、集水桝工			当面継続
防災調整池工 擁壁工（背面埋戻し）		準備工 ■■■	5月末まで
植生工 植生マット工		4月から施工開始予定	当面継続

令和6年2月から除排雪を行っており、4月から本格的に工事を再開する予定です。

- ・敷地造成工：3月下旬から改良機・重機走路を整備し、4月から土工事を再開。
- ・雨水排水設備工：4月から土工事の進捗に伴い、排水側溝を設置。
- ・防災調整池工：4月から右岸擁壁背面の埋戻しを再開。防災調整池左岸の切土が完了する6月から擁壁工を再開。
- ・植生工：掘削で土が露出した斜面を保護するため、草が生えるマットを張り付け。
- ・大型重機等搬入：工事の再開に伴い、3月下旬から大型車両の通行が多くなります。

出入口に交通誘導員を配置し、搬出経路等の安全通行に努めてまいります。

地域の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。

お問い合わせ先

【発注者】

一般財団法人 クリーンいわて事業団八幡平駐在 (TEL: 0195-78-8872)


【受注者】

大成建設(株)・(株)平野組・大森工業(株)特定共同企業体

公共関与型最終処分場土木施設建設工事作業所 (TEL: 0195-78-8212)

2 工事箇所図

令和6年3月～5月の予定 ※除排雪完了後

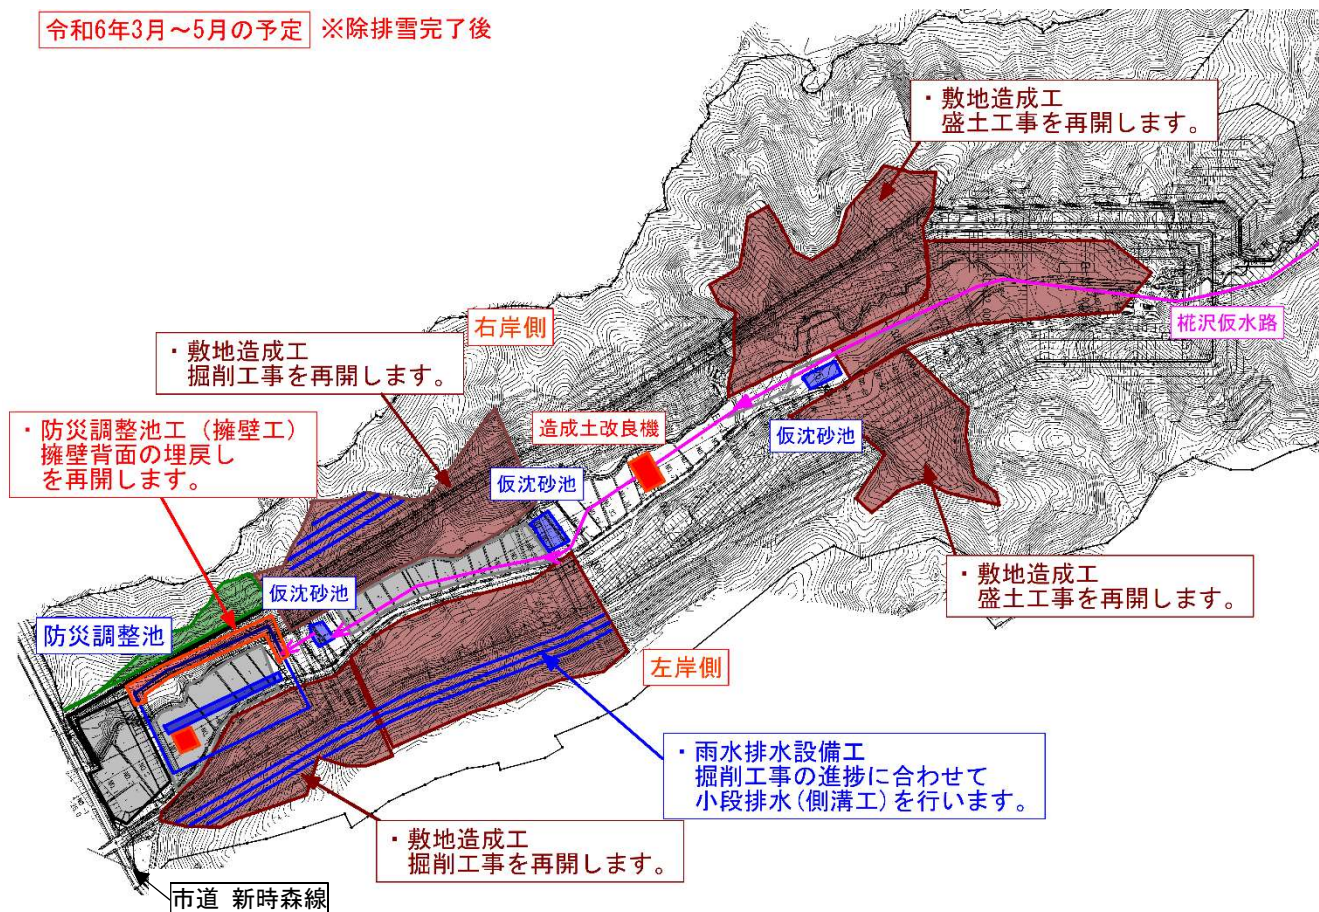

3 工事進捗状況（1月～3月） 除排雪作業のみ

(1) 積雪状況



積雪状況（出入口）



積雪状況（防災調整池）



積雪状況（造成土改良機付近）

(2) 除排雪状況



除雪状況



運搬状況



集積状況
