

令和6年4月4日

地域にお住いの皆様へ

一般財団法人クリーンいわて事業団

公共関与型産業廃棄物最終処分場整備事業に係る 処理水放流管敷設工事の進捗状況のお知らせ

八幡平市平舘における標記施設の整備につきましては、平素より特段の御理解、御協力をいただき、厚く御礼申し上げます。現在、栴沢地区内などで行っている処理水放流管敷設工事の進捗等について、以下のとおり御報告します。

1 工事工程（工事期間：令和4年12月13日～令和7年3月15日）

施 工 内 容	令和6年			備 考
	3月	4月	5月	
全体延長 2,484.5m (内、市道区間 1,972.0m)				3月1日時点
放流管敷設工				1,972m 施工済み (進捗率 79.4%)
マンホール工				全7箇所の内、 7箇所施工済み
本復旧工（舗装）		—	—	1,020m 施工済み (進捗率 51.7%)

- ・市道に処理水放流管を敷設する工事は、令和5年11月25日に完了しました。
- ・市道の舗装本復旧（下流の区間）は、令和5年11月に施工しました。
（上流区間：令和6年4月以降に施工予定（裏面の平面図を参照願います。））
- ・令和6年4月以降の舗装本復旧は、引続き片側通行で施工します。
- ・道路路肩の復旧については、令和6年4月以降の舗装本復旧と合わせて施工する予定です。なお、道路路肩は、土による復旧を基本としています。（車両の出入口は、砕石とする場合もございます。）

地域の皆様には御理解と御協力をいただきますようお願い申し上げます。

お問い合わせ先


【発注者】

一般財団法人 クリーンいわて事業団八幡平駐在（TEL：0195-78-8872）

【受注者】

岩井建設株式会社（所在地：雫石町 TEL：019-692-1181）

2 施工状況平面図

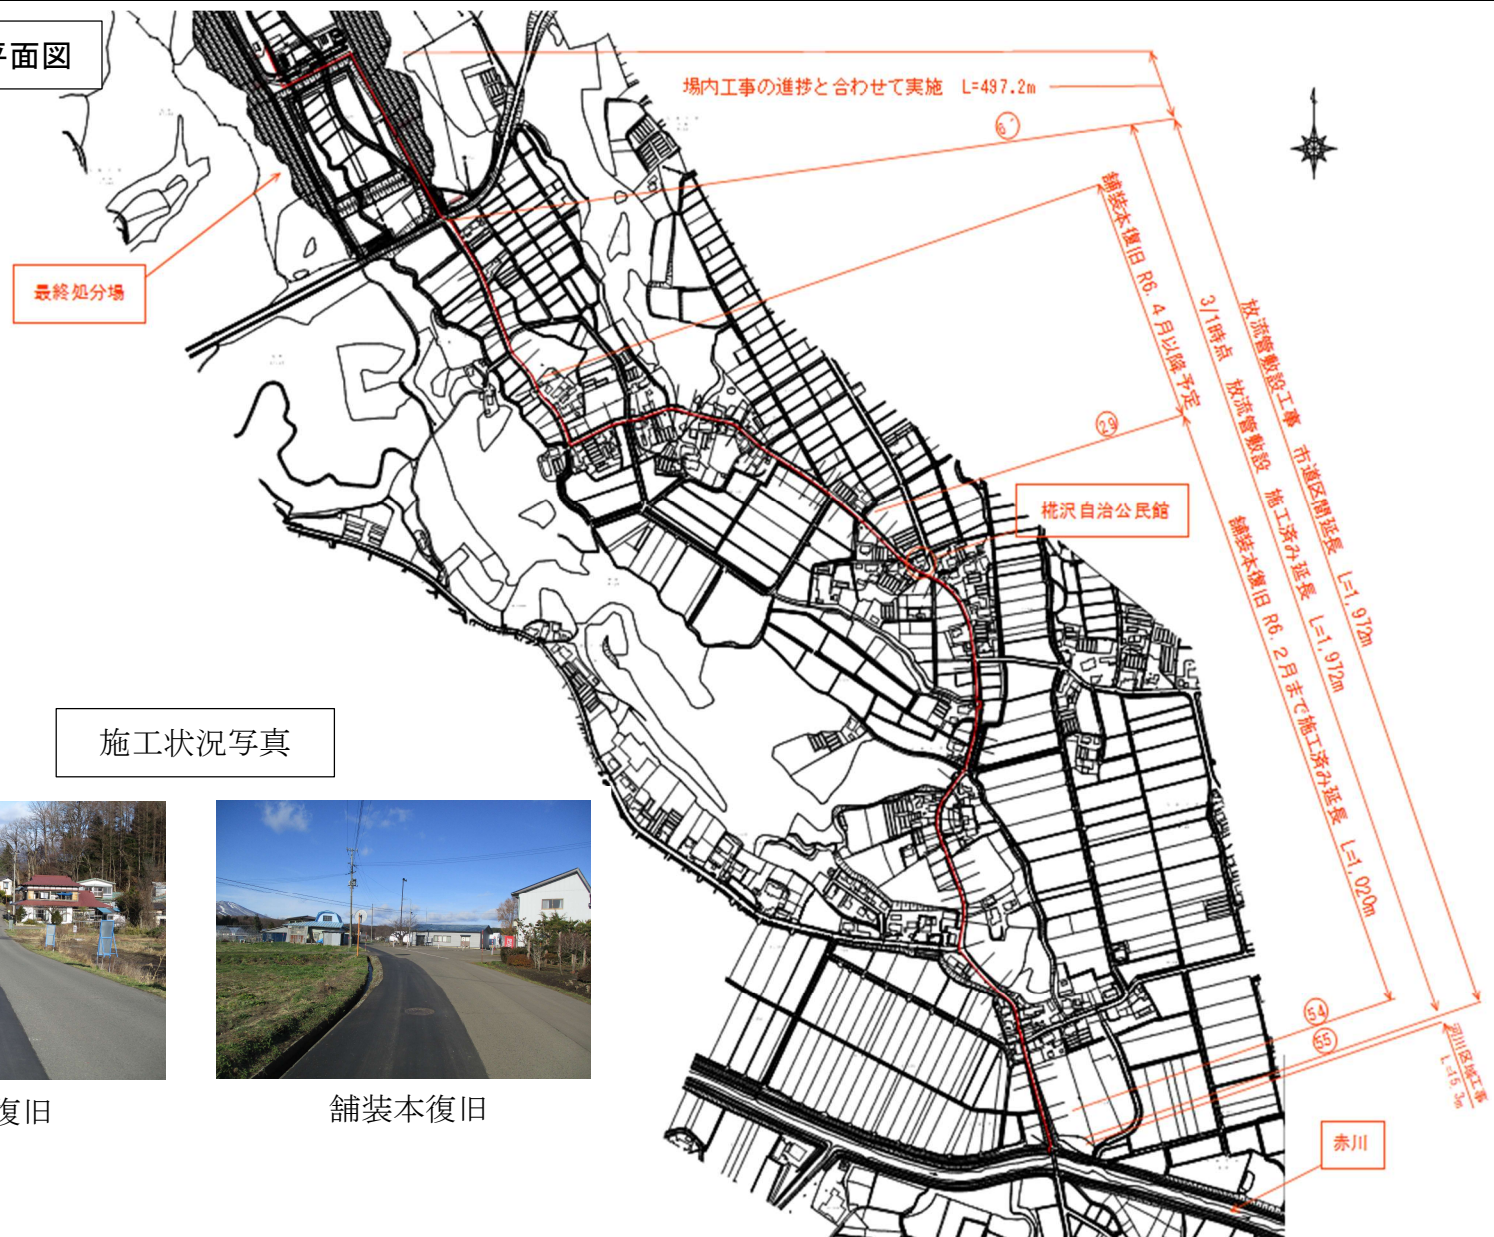

施工状況写真



舗装本復旧



舗装本復旧
