

地域にお住まいの皆様へ

一般財団法人クリーンいわて事業団

公共関与型産業廃棄物最終処分場整備事業に係る 土木施設建設工事の進捗状況のお知らせ

八幡平市平館における標記施設の整備につきましては、平素より特段の御理解、御協力をいただき、厚く御礼申し上げます。建設工事の進捗等について、以下のとおり御報告します。

1 処分場整備事業場内の工事工程

施 工 内 容	令和6年					
	5月		6月		7月	
敷地造成工 掘削工、盛土工						当面継続
雨水排水設備工 側溝工、集水桝工他						当面継続
防災調整池工 擁壁工（土工・擁壁工）						当面継続
植生工 植生マット工 植生基材吹付工						当面継続

4月から本格的に土工事が再開し、約30台の重機が現場で稼働しています。

（裏面の図等を御覧ください。）

- ・敷地造成工：場内の大型重機が本格的に稼働し、土工事がこれから最盛期を迎えます。
- ・雨水排水設備工：土工事の進捗に伴い、排水側溝を整備していきます。
- ・防災調整池工：7月から本格的に左岸側のコンクリート擁壁の構築が始まります。
- ・植生工：斜面保護のため、草が生えるマットを4月から張っています。
- ・資材等搬入：工事が最盛期を迎え、コンクリートや資材の搬入車両が多くなります。

出入口に交通誘導員を配置し、搬出経路等の安全通行に努めてまいります。
地域の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。

お問い合わせ先

【発注者】


一般財団法人 クリーンいわて事業団八幡平駐在（TEL：0195-78-8872）

【受注者】

大成建設㈱・㈱平野組・大森工業㈱特定共同企業体

公共関与型最終処分場土木施設建設工事作業所（TEL：0195-78-8212）

2 工事箇所図（5月～7月）

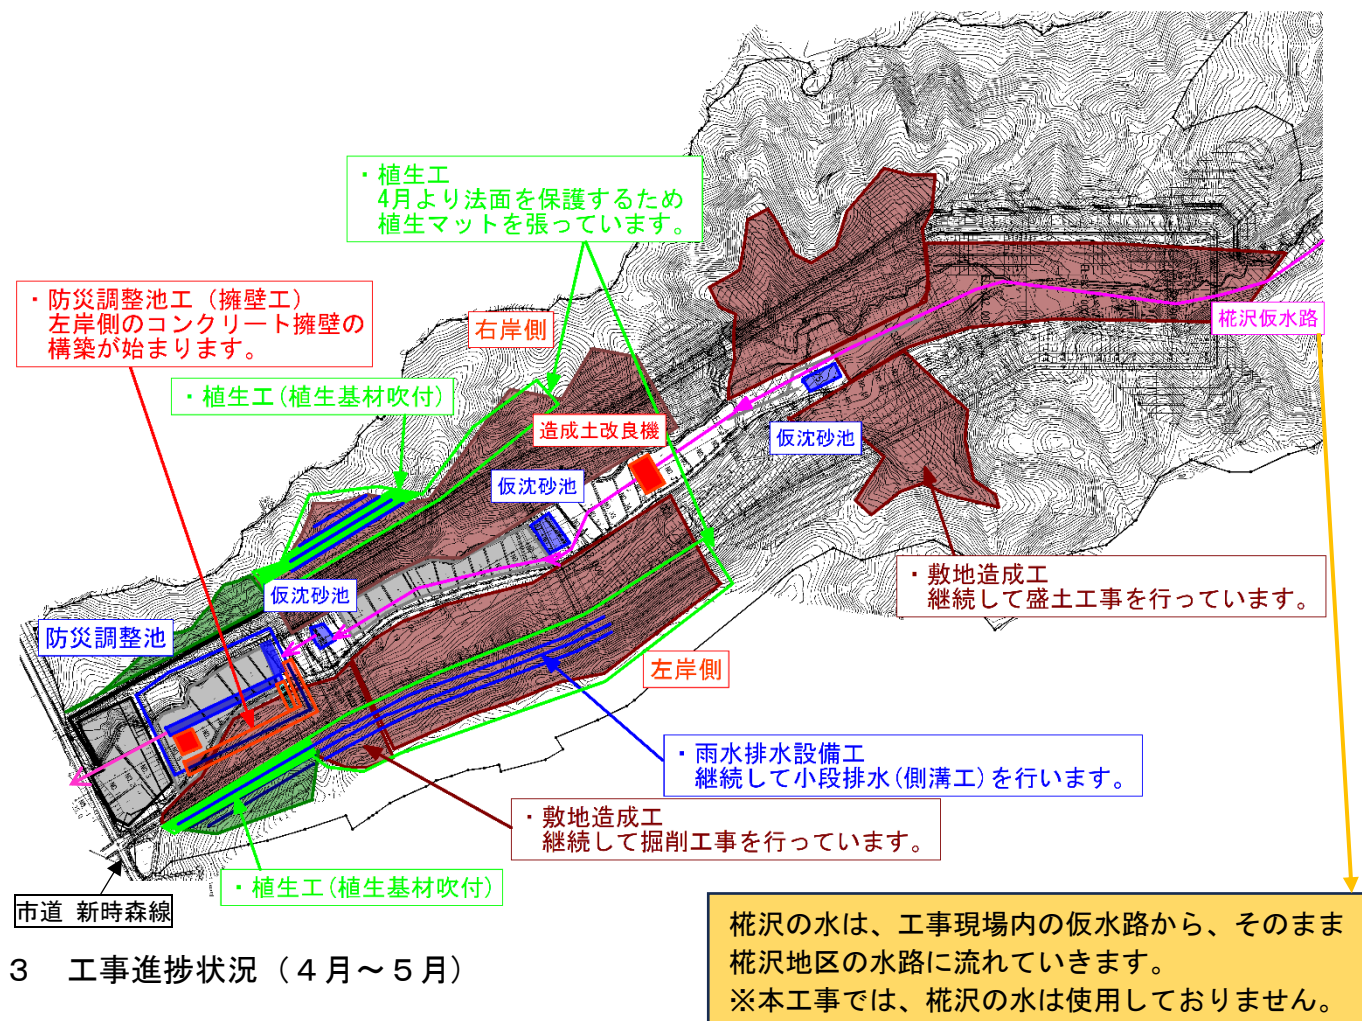

3 工事進捗状況（4月～5月）

(1) 掘削工、盛土工



造成状況（全景）



造成土改良機（施工中）



盛土工（施工中）

(2) 植生工、排水工、擁壁工



植生マット張り（施工中）



側溝設置（設置完了）



擁壁埋戻し（施工中）
