

地域にお住まいの皆様へ

一般財団法人クリーンいわて事業団

## 公共関与型産業廃棄物最終処分場整備事業に係る 土木施設建設工事の進捗状況のお知らせ

八幡平市平館における標記施設の整備につきましては、平素より特段の御理解、御協力をいただき、厚く御礼申し上げます。建設工事の進捗等について、以下のとおり御報告します。

### 1 処分場整備事業場内の工事工程

施 工 内 容	令和5年		令和6年
	11月	12月	1月～3月
敷地造成工 掘削工、盛土工	当面継続		・令和5年12月末～ 令和6年2月中旬 冬期休工（工事休止） ・令和6年2月中旬～ 場内の除排雪着手 ・令和6年3月上旬 工事再開予定
雨水排水設備工 側溝工、集水桝工	当面継続		
防災調整池工 擁壁工（構築工・埋戻し）	令和6年7月頃完成予定		

令和5年6月から盛土工事や防災調整池工事が本格的に開始されましたが、地域の皆様の御協力により、順調に工事を進めることができました。

- ・敷地造成工事：11月末で年内の作業を概ね終了（12月に多少の作業あり）
- ・雨水排水設備工：12月中は側溝工事を実施する予定
- ・防災調整池工：今年施工分のコンクリート構造物の工事完了、年内は埋戻し工等を予定
- ・大型重機等搬出：12月中旬～年末に行うので、大型車両の通行が多くなります。

出入口に交通誘導員を配置し、搬出経路等の安全通行に努めてまいります。  
地域の皆様から御理解と御協力いただきますようお願い申し上げます。

#### お問い合わせ先

##### 【発注者】

一般財団法人 クリーンいわて事業団八幡平駐在（TEL：0195-78-8872）


##### 【受注者】

大成建設(株)・(株)平野組・大森工業(株)特定共同企業体

公共関与型最終処分場土木施設建設工事作業所（TEL：0195-78-8212）

## 2 工事箇所図

令和5年11月～12月の予定

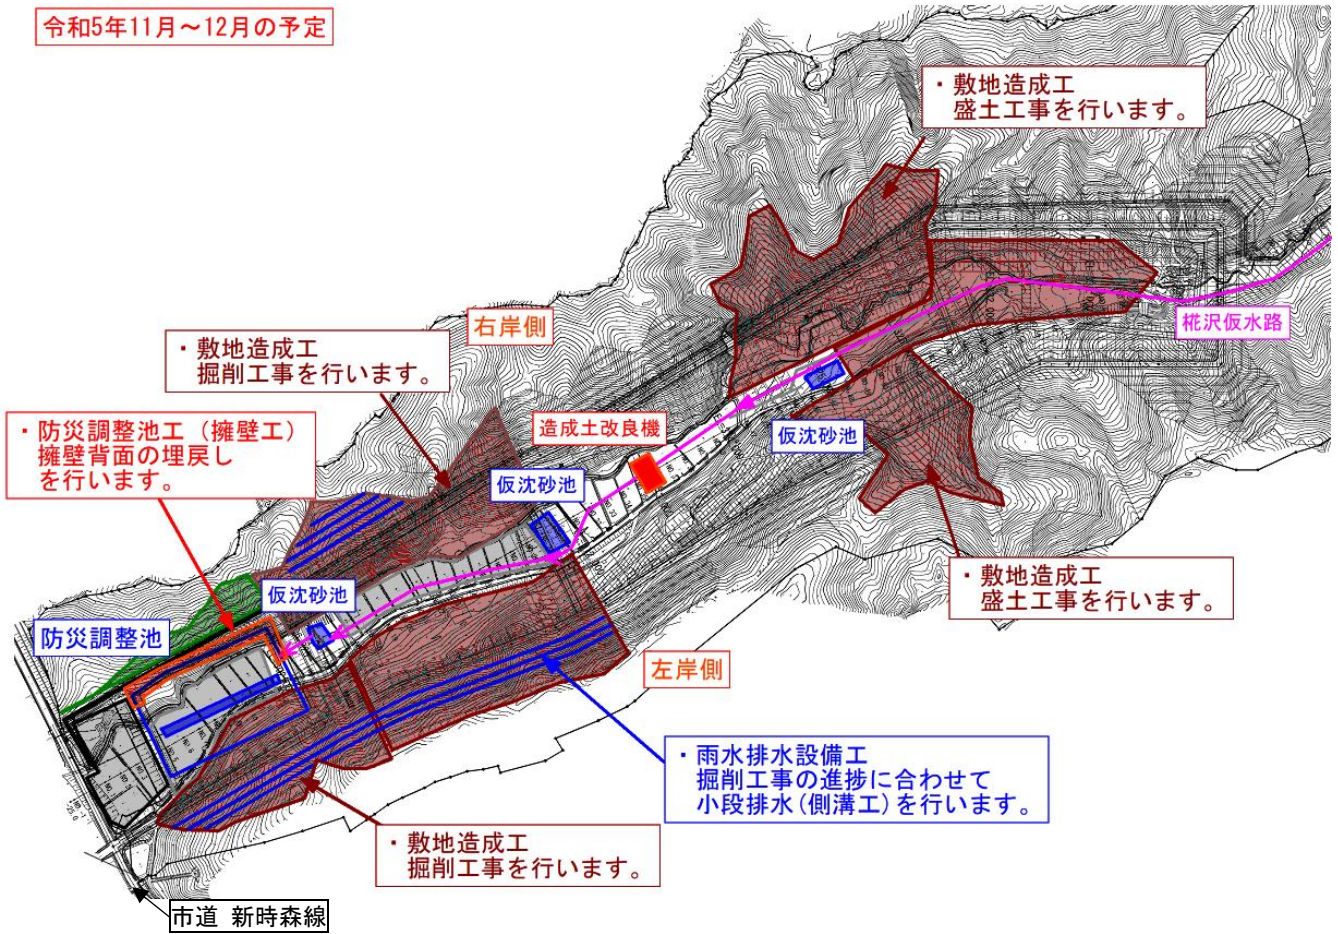

## 3 工事進捗状況（9月～11月）

### (1) 盛土工事（敷地造成工）



造成状況（全景）



掘削状況（施工中）



盛土状況（施工中）

### (2) 防災施設工事（防災調整池工）、雨水排水設備工（小段排水工）



擁壁構築状況（施工中）



右岸側 擁壁構築完了



小段排水施工状況（施工中）
