

地域にお住いの皆様へ

一般財団法人クリーンいわて事業団

公共関与型産業廃棄物最終処分場整備事業に係る 処理水放流管敷設工事の進捗状況のお知らせ

八幡平市平館における標記施設の整備につきましては、平素より特段の御理解、御協力をいただき、厚く御礼申し上げます。現在、椛沢地区内などで行っている処理水放流管敷設工事の進捗等について、以下のとおり御報告します。

(裏面の図を御覧ください。)

1 工事工程 (工事期間：令和4年12月13日～令和7年3月15日)

施 工 内 容	令和6年			備 考
	6月	7月	8月	
全体延長 2,484.5m (内、市道区間 1,972.0m)				6月1日時点
放流管敷設工	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 工事一時休止 </div>			1,972m 施工済み (進捗率 79.4%)
マンホール工	<div style="border: 2px dashed black; border-radius: 50%; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 処理水放流管の赤川との接続部は、台風シーズンが終わる11月からの工事となるので、9月まで一時休止し、10月から再開に向けた準備をします。 </div>			全7箇所全て施工済み
本復旧工 (舗装)				1,620m 施工済み (進捗率 82.2%)

- ・市道に処理水放流管を敷設する工事は、令和5年11月25日に完了しました。
- ・市道の舗装本復旧（下流の区間）は、令和5年11月に施工しました。
(上流区間：令和6年4月に施工しました。)
- ・道路路肩の復旧については、令和6年4月に舗装本復旧と合わせて施工しました。
- ・最終処分場内の放流管を敷設する工事は、場内施設工事の進捗と合わせて実施する予定です。

地域の皆様には御理解と御協力をいただきますようお願い申し上げます。

お問い合わせ先


【発注者】

一般財団法人 クリーンいわて事業団八幡平駐在 (TEL：0195-78-8872)

【受注者】

岩井建設株式会社 (所在地：雫石町 TEL：019-692-1181)

2 施工状況平面図

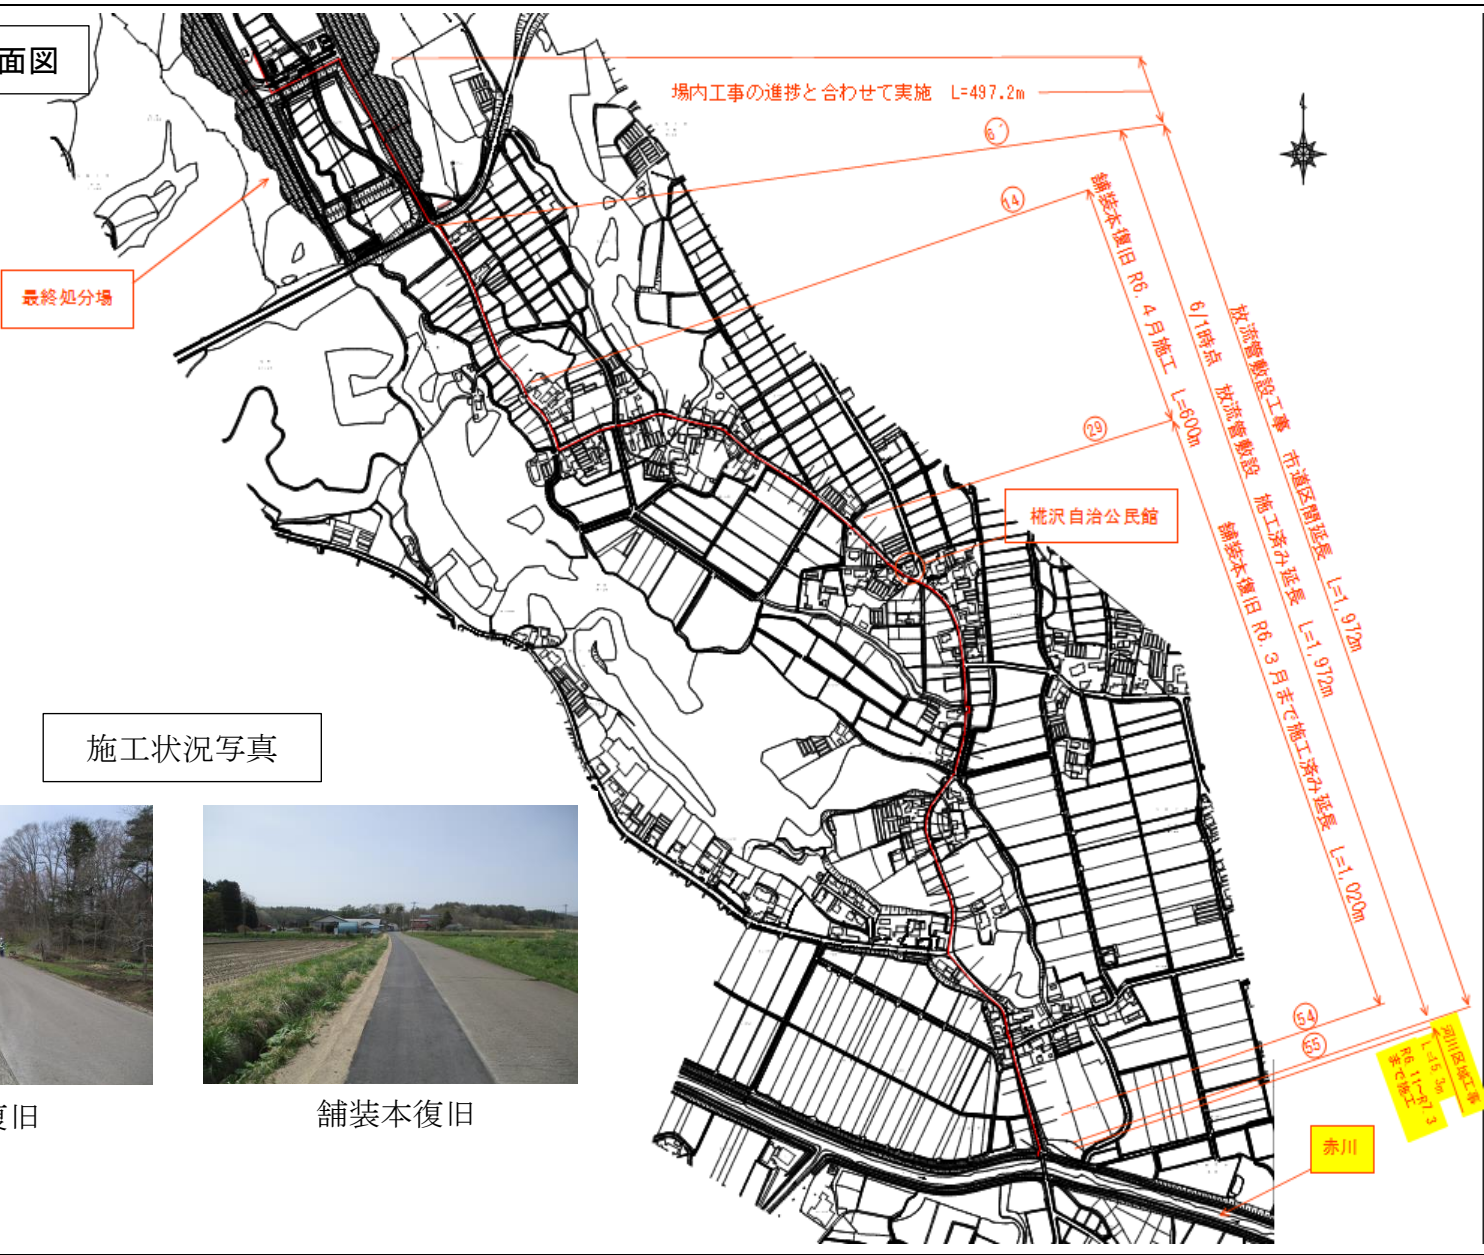

施工状況写真



舗装本復旧



舗装本復旧
