

令和6年9月26日

地域にお住いの皆様へ

一般財団法人クリーンいわて事業団

## 公共関与型産業廃棄物最終処分場整備事業に係る 処理水放流管敷設工事の進捗状況のお知らせ

八幡平市平舘における標記施設の整備につきましては、平素より特段の御理解、御協力をいただき、厚く御礼申し上げます。現在、椛沢地区内などで行っている処理水放流管敷設工事の進捗等について、以下のとおり御報告します。

(裏面の図を御覧ください。)

### 1 工事工程 (工事期間：令和4年12月13日～令和7年3月15日)

施 工 内 容	令和6年			備 考
	9月	10月	11月	
全体延長 2,484.5m (内、市道区間 1,972.0m)	工事一時 休止	工事準備 期間		9月10日時点
放流管敷設工				1,972m 施工済み (進捗率 79.4%)
マンホール工				全7箇所全て施工 済み
本復旧工 (舗装)				1,620m 施工済み (進捗率 82.2%)

- ・処理水放流管の赤川との接続部は、台風シーズンが終わる11月からの工事着手予定です。10月から着手に向けた準備をします。
- ・最終処分場内の放流管を敷設する工事は、場内施設工事の進捗と合わせて11月から再開する予定です。  
地域の皆様には御理解と御協力をいただきますようお願い申し上げます。

#### お問い合わせ先


##### 【発注者】

一般財団法人 クリーンいわて事業団八幡平駐在 (TEL: 0195-78-8872)

##### 【受注者】

岩井建設株式会社 (所在地: 雫石町 TEL: 019-692-1181)

## 2 施工状況平面図

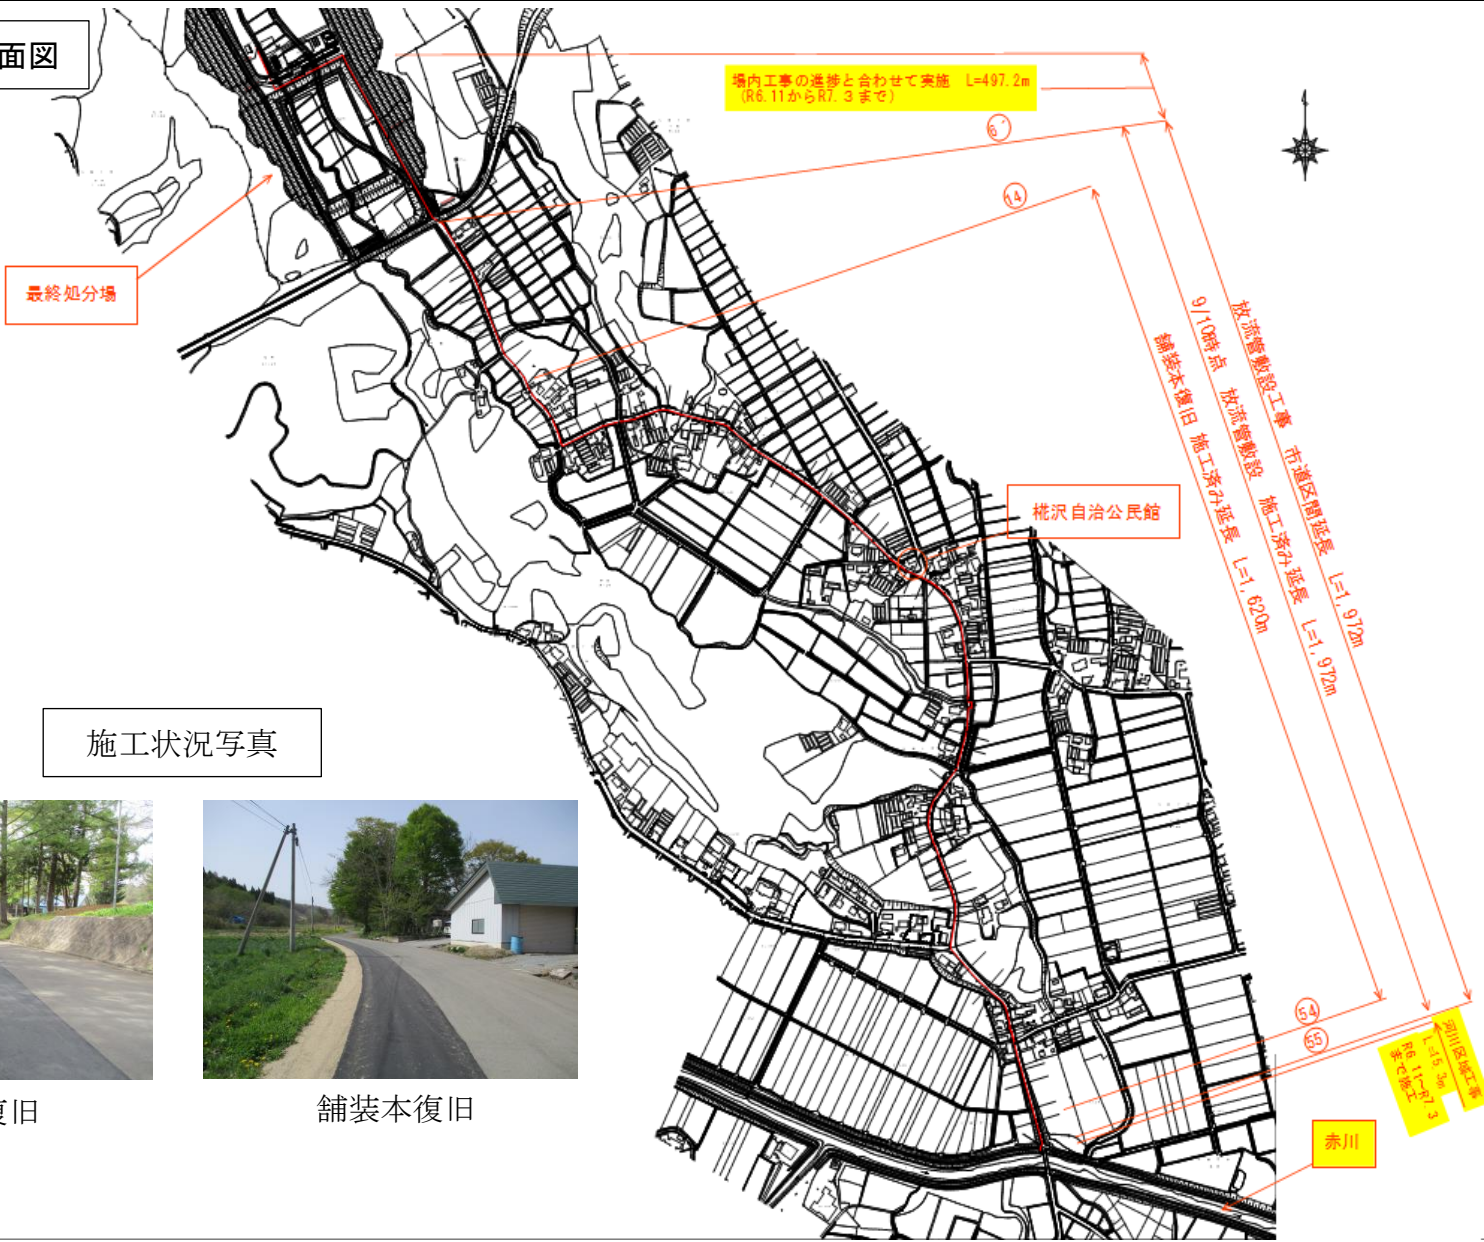

## 施工状況写真



舗装本復旧



舗装本復旧
