

地域にお住まいの皆様へ

一般財団法人クリーンいわて事業団

公共関与型産業廃棄物最終処分場整備事業に係る 土木施設・浸出水処理施設建設工事の進捗状況のお知らせ

八幡平市平館における標記施設の整備につきましては、平素より特段の御理解、御協力をいただき、厚く御礼申し上げます。建設工事の進捗等について、以下のとおり御報告します。

1 処分場整備事業場内の工事工程（裏面の図をご覧ください。）

施 工 内 容		令和7年		令和8年
		11月	12月	1月
土 木 施 設	敷地造成工（掘削工、盛土工）	年内の作業終了		
	雨水排水設備工（側溝工等）			冬期間も継続して施工
	防災調整池工（擁壁工等）	完成		
	付替河川工（水路工等）	完成		
	遮水工（遮水シート施工）	年内の作業終了		
	管理棟工事（事務棟建設）	年内の作業終了		
処 理 施 設 浸 出 水	調整槽工事（廃水の貯水槽建設）			冬期間も継続して施工
	処理棟工事（浄化施設建設）			冬期間も継続して施工

◆工事の再開時期

- ・敷地造成工 4月上旬
- ・遮水工 3月中旬
- ・管理棟工事 3月上旬

昨年は、地域の皆様の御協力により、各工事を下記のとおり進めることができました。

- ・敷地造成工：I期埋立地周辺の掘削を行い、11月末で年内の作業を終了しました。（4月再開）
- ・雨水排水設備工：場内の排水側溝や埋立地底面の排水管等を冬期間も施工します。
- ・防災調整池工：12月に防災調整池が完成しました。
- ・付替河川工：12月に付替河川が完成しました。
- ・遮水工：I期埋立地法面の遮水シートについて、年内の作業を終了しました。（3月再開）
- ・管理棟工事：基礎土間コンクリートを打設し、年内の作業を終了しました。（3月再開）
- ・調整槽工事：水張試験や防水防食塗装を冬期間も施工します。
- ・処理棟工事：基礎土間、1F本体工事及び防水防食塗装を冬期間も施工します。


【発注者】

一般財団法人クリーンいわて事業団八幡平駐在（TEL：0195-78-8872）

【受注者】

- ・土木施設建設工事：大成建設(株)・(株)平野組・大森工業(株)特定共同企業体
公共関与型最終処分場土木施設建設工事作業所（TEL：0195-78-8212）
- ・浸出水処理施設建設工事：水ingエンジニアリング(株)（現場代理人：090-9523-9201）

2 工事箇所図 (令和7年11月～令和8年1月)

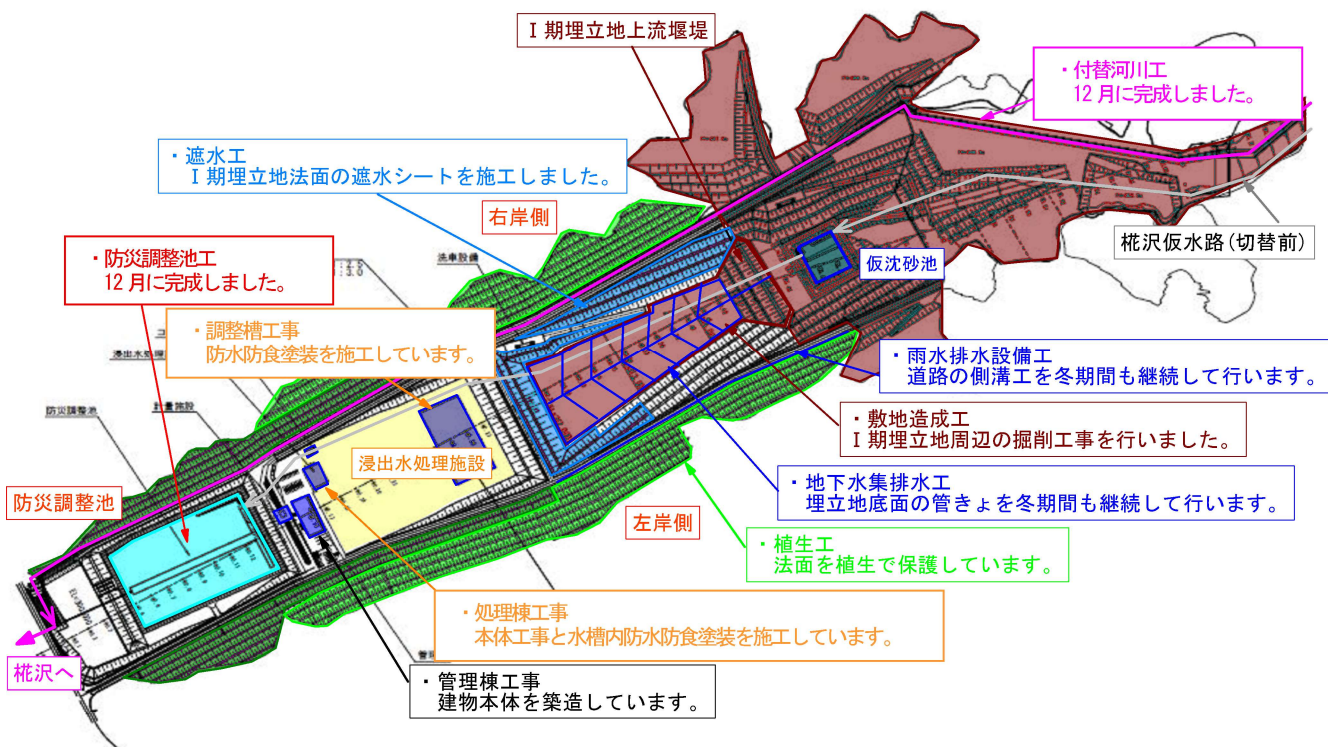

3 工事進捗状況 (令和7年11月～令和8年1月)



造成状況 (全景) R7. 12. 2 撮影




埋立地 掘削・盛土 (施工中)



遮水シート設置 (施工中)



付替河川上流部 (完成直前の様子)

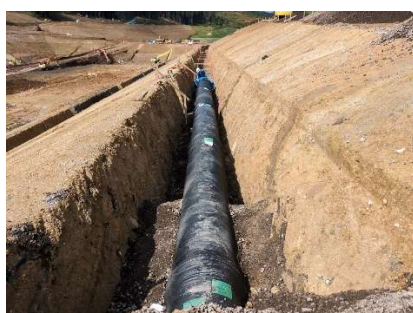

浸出水集排水管 (施工中)



管理棟工事 鉄筋組立 (施工中)



浸出水処理施設 調整槽 (施工中)



浸出水処理施設 処理棟 (施工中)
